


A4.1 Планирование проектов

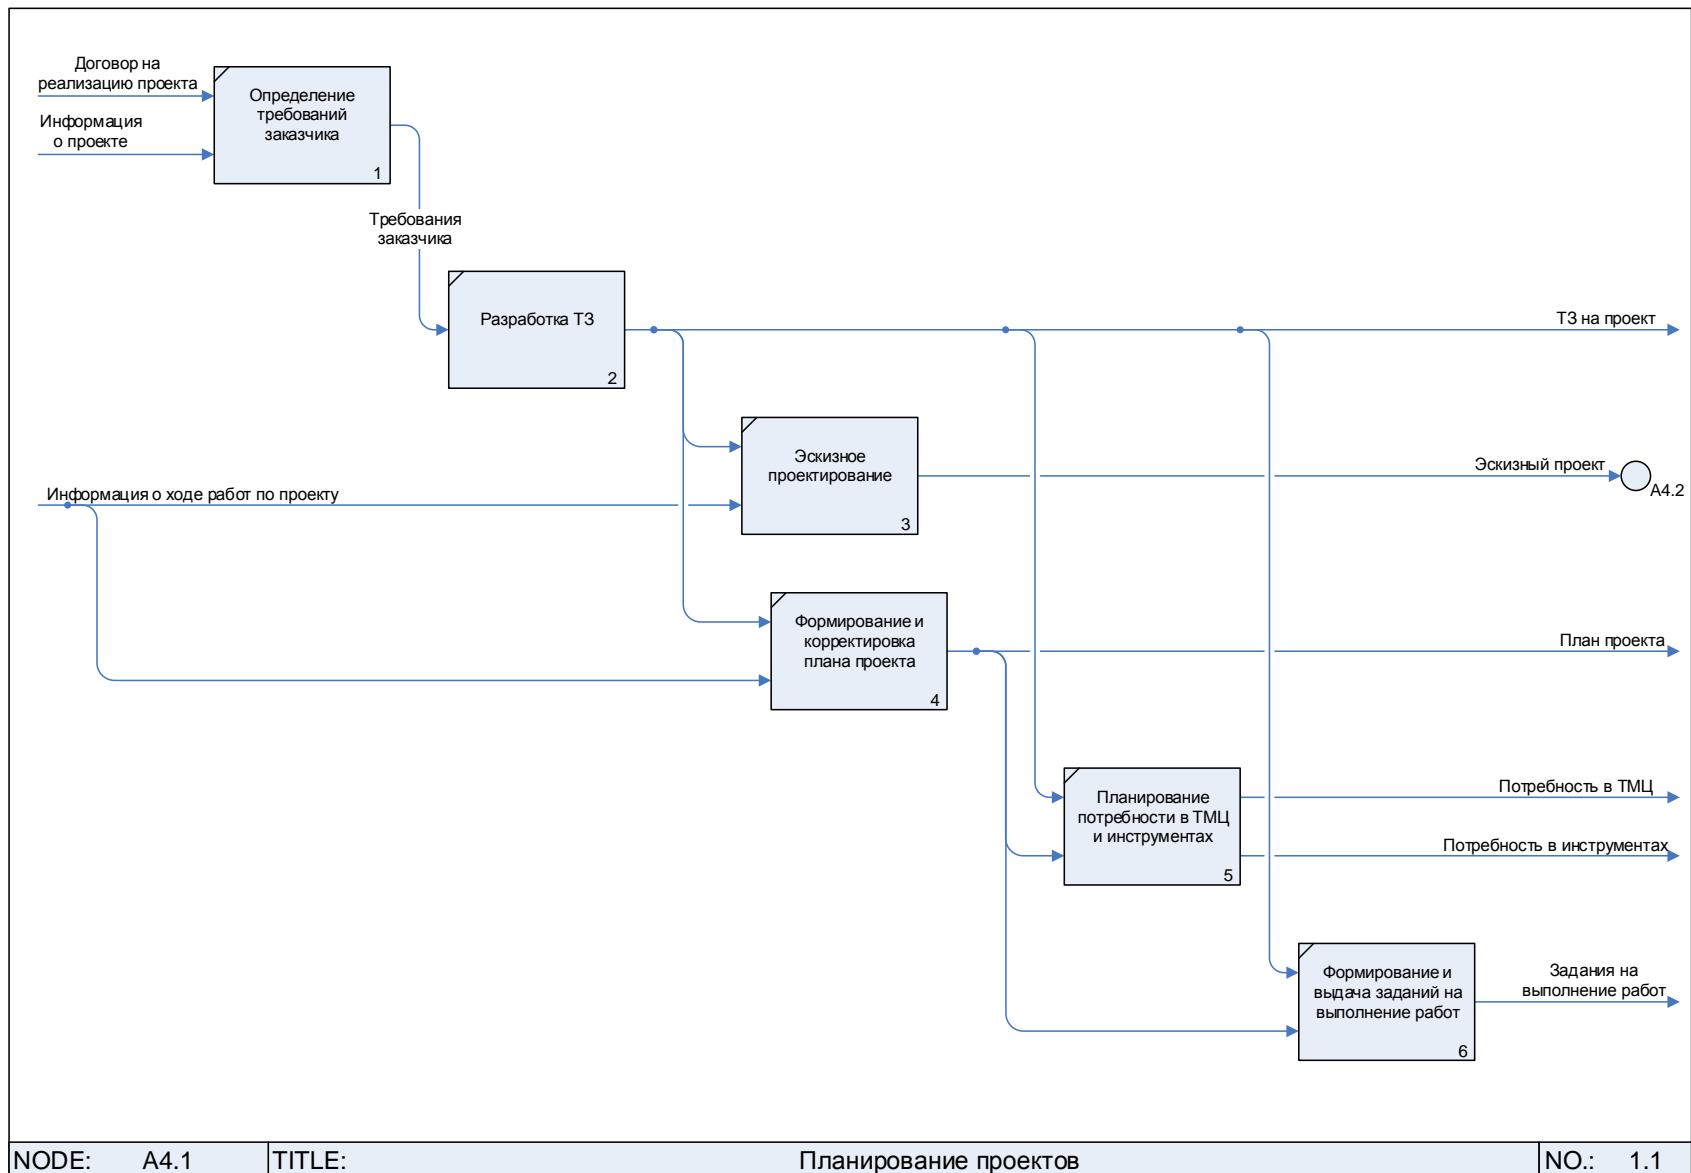

Содержанием деятельности по процессу «А4.1 Планирование проектов» является планирование проектов в соответствии с требованиями заказчика и возможностями ООО "ИнТехПроект".

Владелец процесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Результат выполнения: план проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на реализацию проекта	Договор	Менеджер по продажам	А2.3 Формирование и заключение договора с клиентом
2.	Информация о проекте	Информация о проекте	Отдел продаж	А2.4 Инициация проекта
3.	Информация о ходе работ по проекту		Команда проекта	А4.2 Реализация проекта

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Задания на выполнение работ	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер	А4.2.1 Предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
			Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Ведущий инженер	А4.2.4 Формирование исполнительной документации
			Мастер	А4.2.5 Пуско-наладочные работы
2.	План проекта	План проекта	Команда проекта	А4.2 Реализация проекта

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
			Команда проекта	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
			Бухгалтерия	A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов
3.	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент	Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
4.	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ	Начальник отдела снабжения	A6.1 Планирование закупок
5.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
			Ведущий инженер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
6.	Эскизный проект	Эскизный проект	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A4.1.1 Определение требований заказчика	Заместитель директора по производству	Руководитель проекта	Вход	Договор на реализацию проекта	Договор	Требования заказчика	
					Информация о проекте	Информация о проекте		
2.	A4.1.2 Разработка ТЗ	Заместитель директора по производству	Ведущий инженер Руководитель проекта	Вход	Требования заказчика		ТЗ на проект	ТЗ на проект

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
3.	А4.1.3 Эскизное проектирование	Руководитель проекта	Инженер-проектировщик	Вход	Информация о ходе работ по проекту		Эскизный проект	Эскизный проект
					ТЗ на проект	ТЗ на проект		
4.	А4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта	Заместитель директора по производству	Руководитель проекта	Вход	Информация о ходе работ по проекту		План проекта	План проекта
					ТЗ на проект	ТЗ на проект		
5.	А4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах	Заместитель директора по производству	Руководитель проекта	Вход	План проекта	План проекта	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент
					ТЗ на проект	ТЗ на проект	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ
6.	А4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ	Заместитель директора по производству	Руководитель проекта	Вход	План проекта	План проекта	Задания на выполнение работ	Задания на выполнение работ
					ТЗ на проект	ТЗ на проект		
